



Finanziato
dell'unione Europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
REGIONALI E LE AUTONOMIE




Parco Regionale
Sirente Velino

PIANO OPERATIVO: GRANDE ANELLO DEL PARCO - PNRR M.2-C.1-I.3.2.

(CUP): I71G22000070001

PROGETTO ESECUTIVO - Grande Anello del Parco

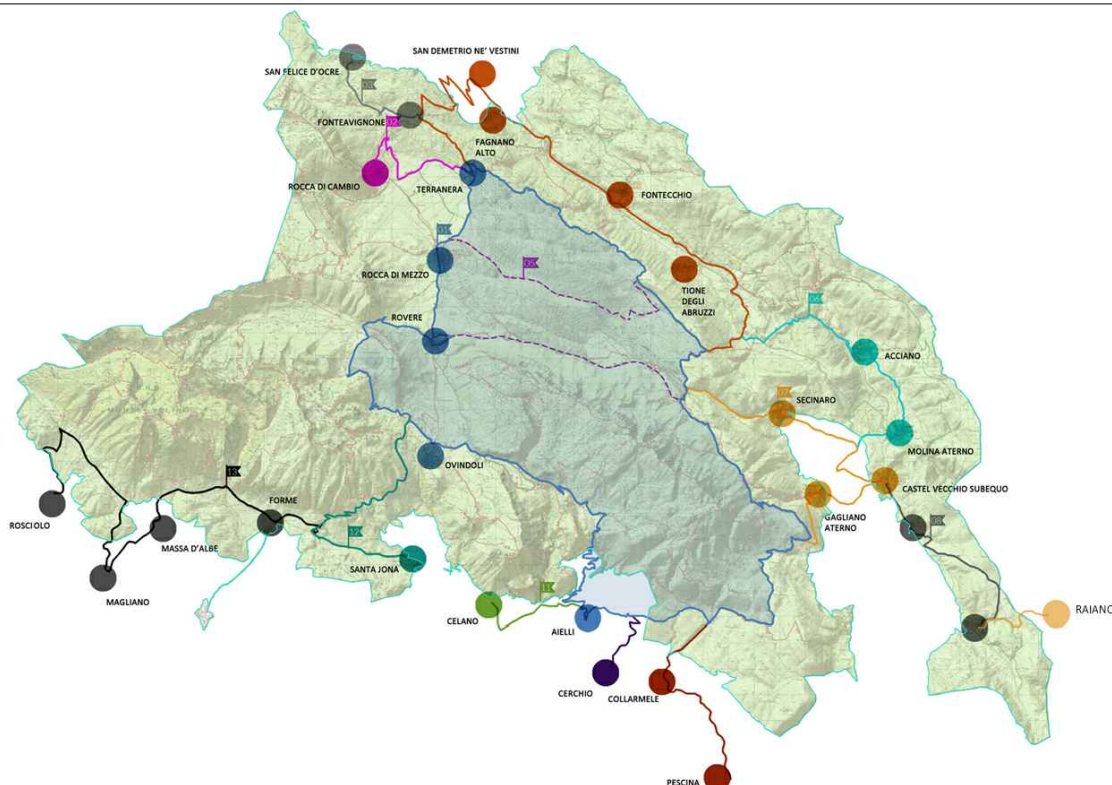

RESPONSABILE DEL PROGETTO: PROGETTISTI:

DIRETTORE
dott. Igino Chiuchiarelli

RUP:
dott. Leucio Angelosante

1AX srl

Via Crispi, 69 - Avezzano (AQ)
0863 416723 - info@1ax.it

RILIEVI E INDAGINI:

GEOLOGIA:
dott. Michele Aureli
ARCHEOLOGIA:
Soc. Coop. LIMES
CARTOGRAFIA E GIS:
dott. Daniele Pisegna

nome elaborato:

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

sigla elaborato:

08b_PSC

data:

NOVEMBRE 2023

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

PRIMA FASE DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	13	18	11/06/2024	28/06/2024
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	12	17	12/06/2024	28/06/2024
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	12	17	12/06/2024	28/06/2024
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	12	17	12/06/2024	28/06/2024
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie	1	E	10	12	24/06/2024	05/07/2024
Rimozione di trattori ambientali (Rufiuti, vegetazione, elementi arredo degradati)	1	E	10	12	24/06/2024	05/07/2024
Scavi e movimentazioni terre	1	E	8	10	01/07/2024	10/07/2024
Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con mezzi meccanici	1	E	8	10	10/07/2024	19/07/2024
Scavo eseguito con martello demolitore	1	E	10	12	22/07/2024	02/08/2024
Costruzione di elementi di ingegneria naturalistica di contenimento	1	E	12	20	25/07/2024	13/08/2024
Realizzazione delle casseforme per le strutture in fondazione	1	E	11	16	16/07/2024	31/07/2024
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1	E	20	28	17/07/2024	09/08/2024
Disfacimento di pavimentazione in pietra	1	E	10	12	22/07/2024	02/08/2024
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	1	E	13	19	05/08/2024	23/08/2024
Posa di pavimenti per esterni in pietra	1	E	16	22	26/08/2024	16/09/2024
Ristabilimento della coesione di opere in pietra	1	E	6	8	17/09/2024	24/09/2024
Rinterro di scavo eseguito a macchina	1	E	9	13	25/09/2024	07/10/2024
Ripristino di percorsi pedonali in misto granulare	1	E	19	24	08/10/2024	31/10/2024
Infissione di paletti in legno e acciaio cort-tene acciaio cor-ten lungo il percorso e di elementi della segnaletica verticale.	1	E	35	40	31/10/2024	28/02/2025

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = Sistemazioni esterne

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

SECONDA FASE DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	20	26	03/03/2025	28/03/2025
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	10	12	17/03/2025	28/03/2025
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	10	12	17/03/2025	28/03/2025
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	10	12	17/03/2025	28/03/2025
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie	1	E	11	13	24/03/2025	05/04/2025
Rimozione di trattori ambientali (Rufiuti, vegetazione, elementi arredo degradati)	1	E	11	13	24/03/2025	05/04/2025
Scavi e movimentazioni terre	1	E	9	11	01/04/2025	11/04/2025
Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con mezzi meccanici	1	E	16	22	14/04/2025	05/05/2025
Scavo eseguito con martello demolitore	1	E	16	22	14/04/2025	05/05/2025
Costruzione di elementi di ingegneria naturalistica di contenimento	1	E	19	25	06/05/2025	30/05/2025
Realizzazione delle casseforme per le strutture in fondazione	1	E	14	18	03/06/2025	20/06/2025
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1	E	16	20	04/06/2025	23/06/2025
Disfacimento di pavimentazione in pietra	1	E	10	12	24/06/2025	14/07/2025
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	1	E	18	22	24/06/2025	14/07/2025
Posa di pavimenti per esterni in pietra	1	E	15	21	15/07/2025	04/08/2025
Ristabilimento della coesione di opere in pietra	1	E	7	9	05/08/2025	13/08/2025
Rinterro di scavo eseguito a macchina	1	E	10	12	18/08/2025	29/08/2025
Ripristino di percorsi pedonali in misto granulare	1	E	15	19	01/09/2025	19/09/2025
Infissione di paletti in legno e acciaio cort-tene acciaio cor-ten ugpercorso	1	E	13	17	08/09/2025	24/10/2025
Realizzazione e montaggio di elementi di arredo in legno, pietra e acciaio cor-ten	1	E	13	17	08/09/2025	24/10/2025
Posa di arredi urbani e servizi bike.z ca	1	E	39	47	27/10/2025	28/11/2025
Smobilizzo cantiere	1	E	11	30	01/12/2025	30/12/2025
Fine lavori						31/01/2026
Collaudo dell'opera	1	E	11	15	01/02/2026	15/02/2026

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = Sistemazioni esterne

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
